
Salle de bain Morin


Bathroom

CLIENT	ADDRESS	DATES	CONTRACT
M. Pierre Morin	27, rue Champlain, Saint-Lambert	October 5 to 28, 2026	C-2026-037

SALLE DE BAIN

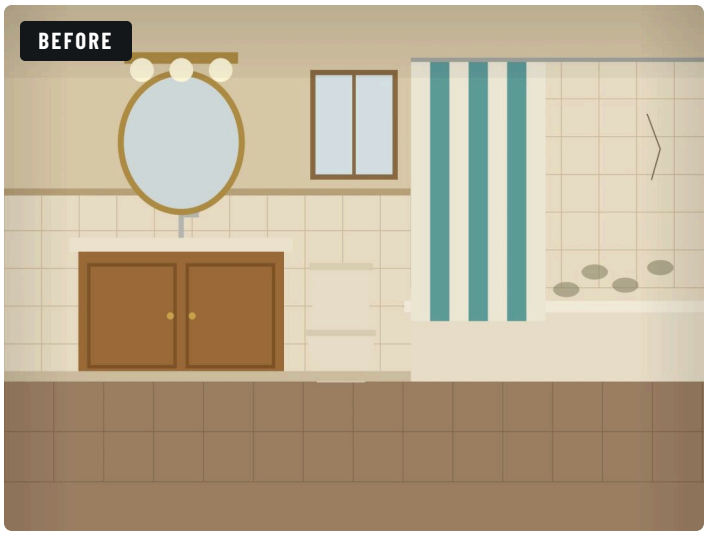

October 5, 2026

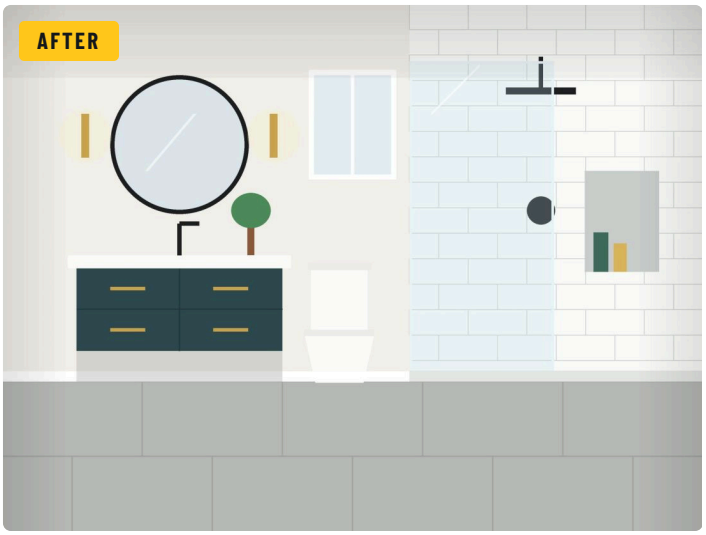

October 28, 2026

DAYS WORKED	HOURS WORKED	CREW	PHOTOS ON FILE
18	309 h	3 people	11

Work done

Rénovation complète de la salle de bain.
Démolition, nouvelle plomberie, douche en céramique avec panneau de verre, meuble-lavabo suspendu, plancher de porcelaine et peinture.

Milestones


- [x] Démolition — Oct 6
- [x] Plomberie et électricité — Oct 9
- [x] Gypse et membrane — Oct 13
- [x] Céramique — Oct 17
- [x] Vanité et accessoires — Oct 21
- [x] Finition — Oct 25
- [x] Inspection — Oct 28

Before and after

CORRIDOR




October 5, 2026

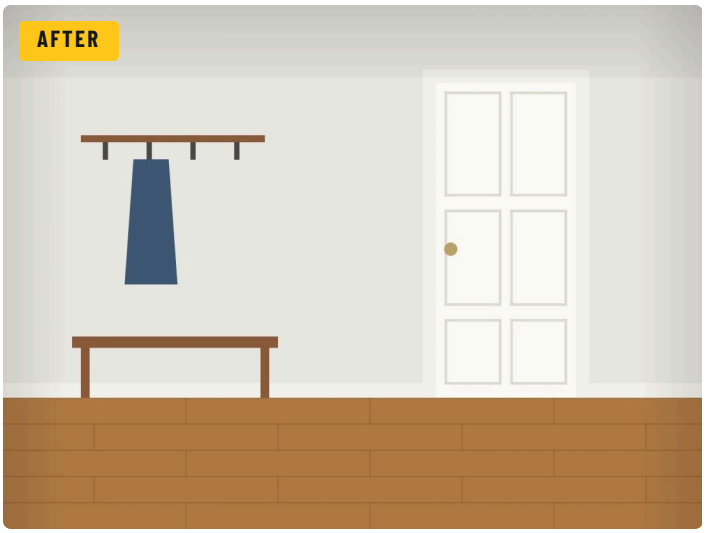


October 28, 2026

SALLE DE BAIN

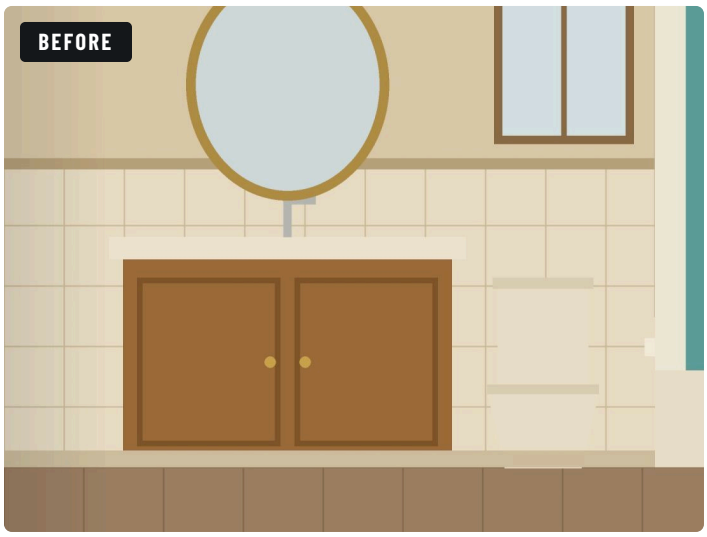


October 5, 2026

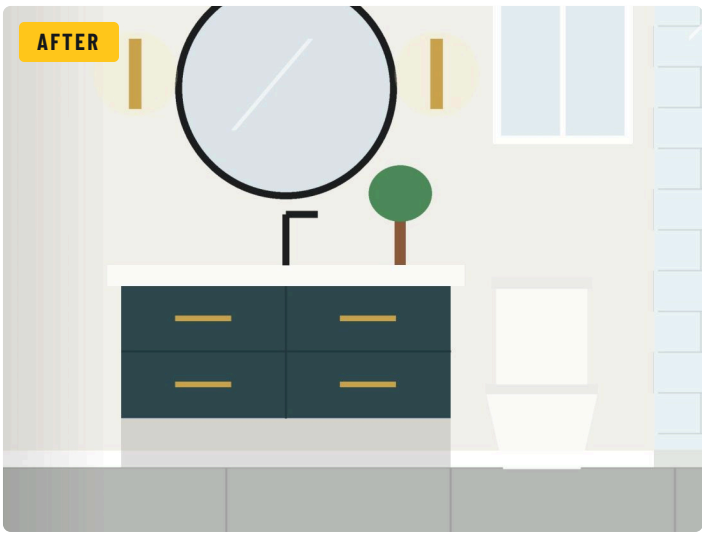

October 28, 2026

After the work



Salle de bain · Oct 28, 14:25

Condition before the work

Photos taken before starting. Each one carries the date and time it was sent.




Corridor · Oct 5, 7:18

Existing damage: Plancher égratigné près de la porte




Salle de bain · Oct 5, 7:15


During the work

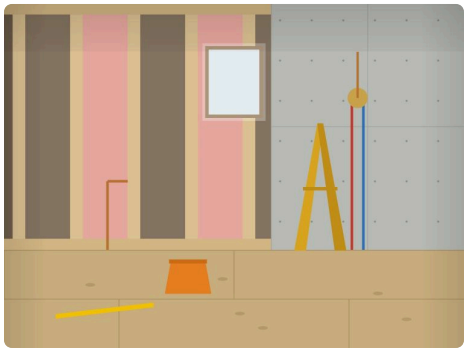

Salle de bain · Oct 8, 14:40

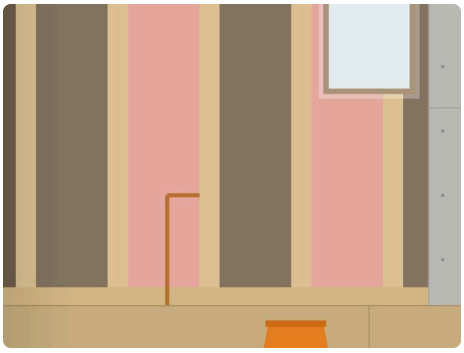

Salle de bain · Oct 13, 11:05

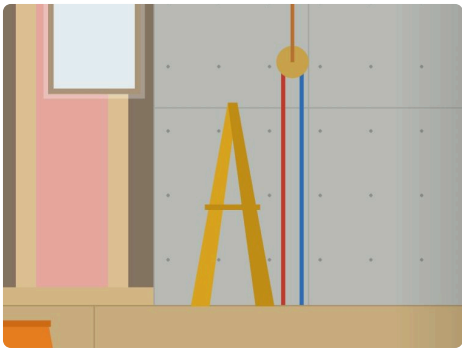

Salle de bain · Oct 18, 15:10

Decisions made during the job

Tuyau de renvoi fissuré SURPRISE

Question from Kevin, Oct 9, 9:40

En ouvrant le mur derrière la douche, on a trouvé le tuyau de renvoi fissuré. On le remplace avant de fermer le mur?



Decision by Marc, Oct 9, 10:05

> **Oui, on le remplace au complet jusqu'au raccord. M. Morin a approuvé le supplément par téléphone.**

Hauteur de la niche QUESTION

Question from Alex, Oct 16, 13:15

On met la niche de la douche à quelle hauteur?

Decision by Marc, Oct 16, 13:32

> **À 48 pouces du plancher fini, centrée sur le mur du fond.**

Materials

Items bought or taken from stock for this job.

Céramique métro blanche 3 x 6	**11 boîtes**
Ciment-colle	**3 sacs**
Coulis gris pâle	**2 sacs**
Tuyau ABS 2 po	**10 pi**
Panneaux de béton léger	**6**
Silicone blanc	**2 tubes**
Vis à gypse 1¼ po	**1 boîte**
Membrane pour douche	**1 rouleau**
Robinet de douche noir mat Replaced: même modèle d'une autre marque, le premier était en rupture	**1**

Hours

309 h worked over 18 days.

Hours punched on the jobsite, unpaid lunch deducted.

Report prepared with Mon Jobsite from the photos, hours and decisions recorded on the jobsite.
