
Salle de bain Morin


Salle de bain

CLIENT	ADRESSE	DATES	CONTRAT
M. Pierre Morin	27, rue Champlain, Saint-Lambert	Du 5 au 28 octobre 2026	C-2026-037

SALLE DE BAIN

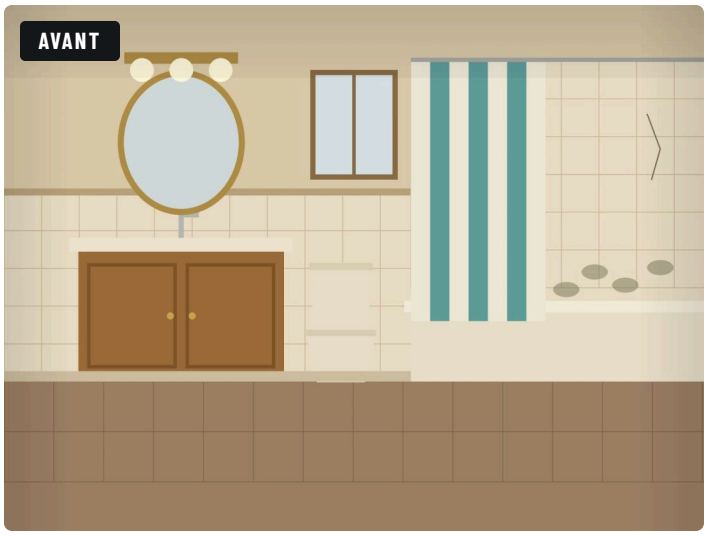

5 octobre 2026

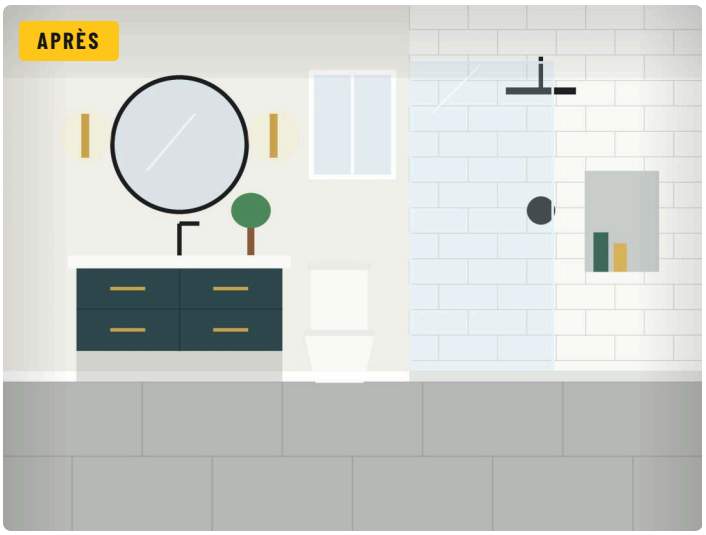

28 octobre 2026

JOURS TRAVAILLÉS	HEURES TRAVAILLÉES	ÉQUIPE	PHOTOS AU DOSSIER
18	309 h	3 personnes	11

Travaux réalisés

Rénovation complète de la salle de bain.
Démolition, nouvelle plomberie, douche en céramique avec panneau de verre, meuble-lavabo suspendu, plancher de porcelaine et peinture.

Étapes

- [x] Démolition — 6 oct.
- [x] Plomberie et électricité — 9 oct.
- [x] Gypse et membrane — 13 oct.
- [x] Céramique — 17 oct.
- [x] Vanité et accessoires — 21 oct.
- [x] Finition — 25 oct.
- [x] Inspection — 28 oct.

Avant et après

CORRIDOR




5 octobre 2026




28 octobre 2026

SALLE DE BAIN

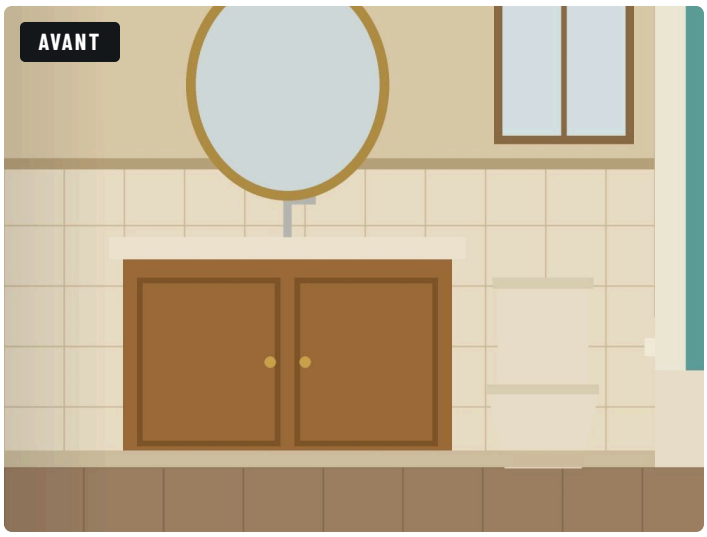


5 octobre 2026

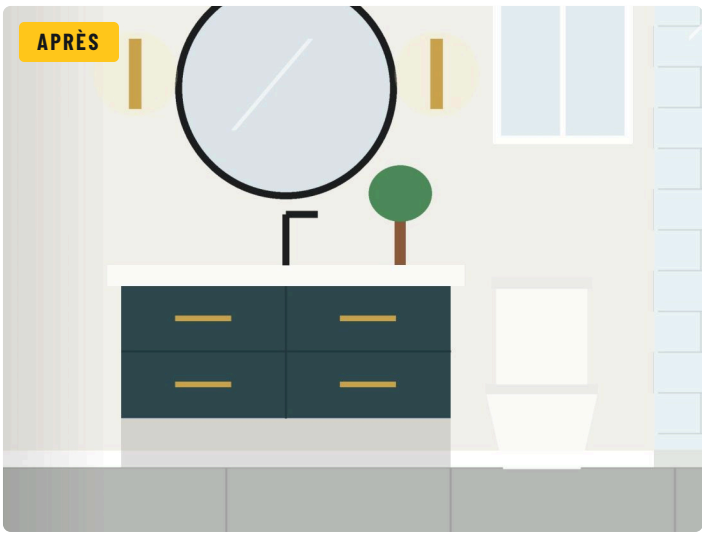

28 octobre 2026

Après les travaux

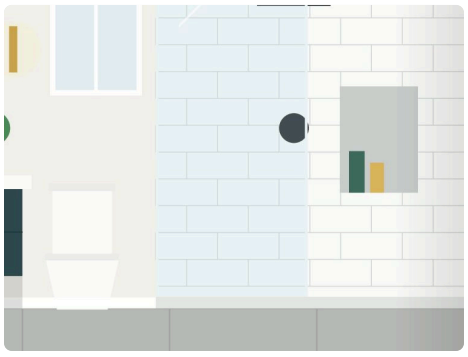

Salle de bain · 28 oct., 14 h 25

État des lieux avant les travaux

Photos prises avant de commencer. Chacune porte la date et l'heure de son envoi.




Corridor · 5 oct., 7 h 18

Dommage existant : Plancher égratigné près de la porte




Salle de bain · 5 oct., 7 h 15


Pendant les travaux

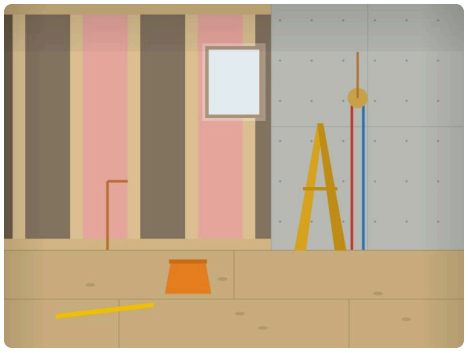

Salle de bain · 8 oct., 14 h 40

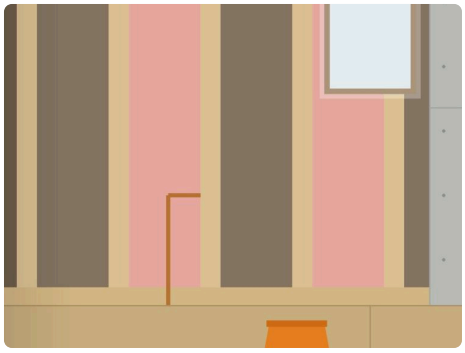

Salle de bain · 13 oct., 11 h 05

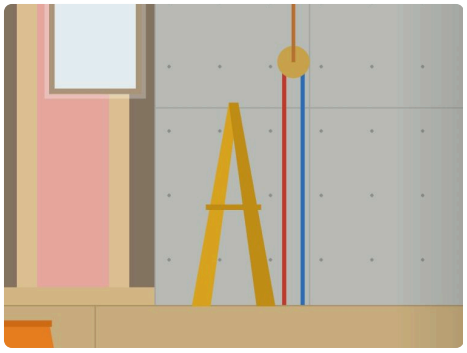


Salle de bain · 18 oct., 15 h 10

Décisions prises en cours de chantier

Tuyau de renvoi fissuré IMPRÉVU

Question de Kevin, 9 oct., 9 h 40

En ouvrant le mur derrière la douche, on a trouvé le tuyau de renvoi fissuré. On le remplace avant de fermer le mur?



Décision de Marc, 9 oct., 10 h 05

> **Oui, on le remplace au complet jusqu'au raccord. M. Morin a approuvé le supplément par téléphone.**

Hauteur de la niche QUESTION

Question de Alex, 16 oct., 13 h 15

On met la niche de la douche à quelle hauteur?

Décision de Marc, 16 oct., 13 h 32

> **À 48 pouces du plancher fini, centrée sur le mur du fond.**

Matériaux

Articles achetés ou sortis de l'inventaire pour ce chantier.

Céramique métro blanche 3 x 6	**11 boîtes**
Ciment-colle	**3 sacs**
Coulis gris pâle	**2 sacs**
Tuyau ABS 2 po	**10 pi**
Panneaux de béton léger	**6**
Silicone blanc	**2 tubes**
Vis à gypse 1¼ po	**1 boîte**
Membrane pour douche	**1 rouleau**
Robinet de douche noir mat Remplacé : même modèle d'une autre marque, le premier était en rupture	**1**

Heures

309 h travaillées sur 18 jours.

Heures pointées sur le chantier, dîner non payé déduit.

Rapport préparé avec Mon Jobsite à partir des photos, des heures et des décisions enregistrées sur le chantier.
